

Bestellvorlage System WABU 3 (TUS 45)

Kunde: _____ Kom.: _____ Raum Nr.: _____

Best.Nr.: _____ Datum: _____ Termin: _____




Maß A: _____ mm **Zargenfalzmaß in der Höhe** + _____ mm Bodeneinstand

Maß B: _____ mm **Zargenfalzmaß in der Breite**

Ohne Sockel 60 mm Sockelhöhe 80 mm Sockelhöhe

DIN L DIN R

Aufmaß: Zu klären ist, wo die OK fertiger Fußboden später liegt (Meterriss). Am Meterriss orientieren sich alle Höhen. Zu klären ist, wie die Fußbodenleisten zur Alu-Zarge liegen, bzw. flächenbündig integriert werden (Sockelleistenauklinkung) denn nur dann macht das System Sinn. Planen Sie mindestens zwei Aufmaßstermine und zwei Montagetermine ein (1. Aufmaß - Rohzarge, Montage der Rohzarge, 2. Aufmaß der Türmaße und dann die Türenfertigmontage). Türstärke stumpf mit Falz (45 mm) ist mit diesem System möglich. Wir empfehlen dringend mit allen beteiligten Gewerken die Ausführung zu besprechen und alle Montagearbeiten aller Gewerke sorgfältig und genau vorzunehmen.

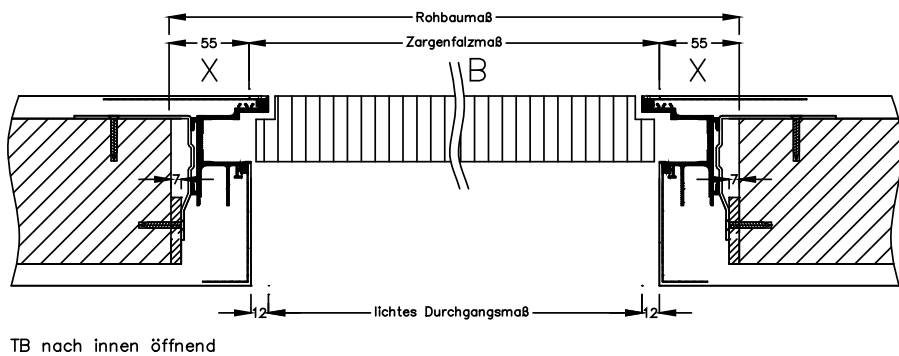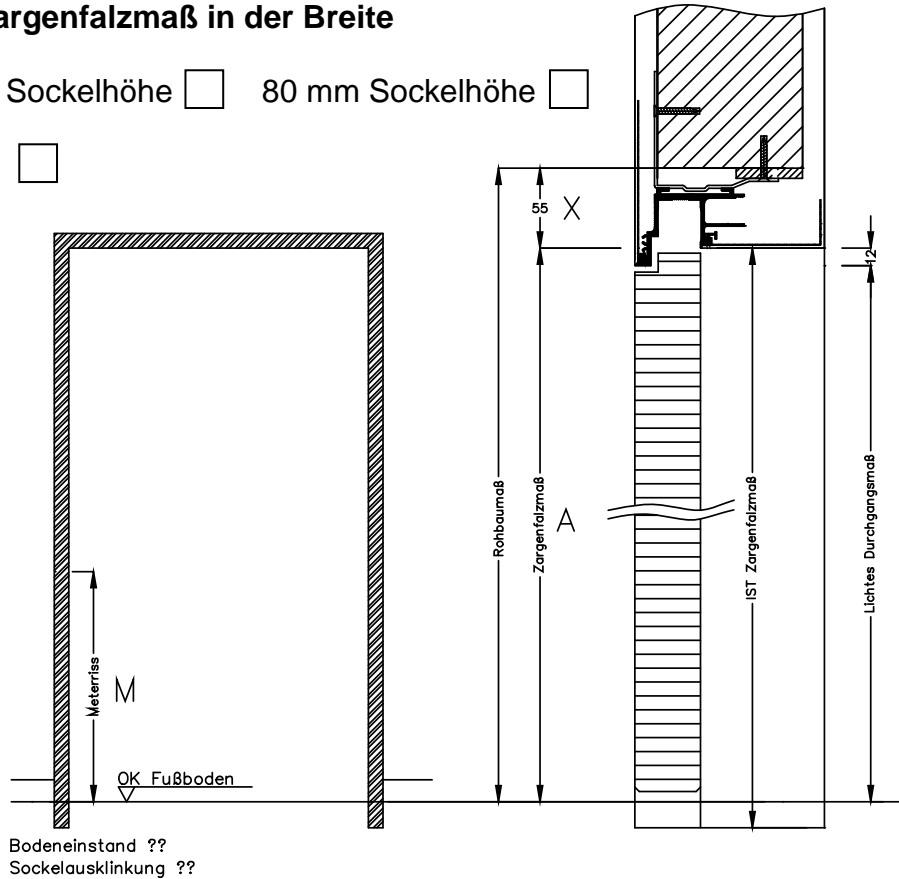

DIN-Richtungen
